

Information travaux n°1
Secteur 2 « Ruffigny – Vivonne »

**MISE AUX NORMES EN FAVEUR DE LA
SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA RN10 DANS LA VIENNE**

Secteur 1
Finalisé en
2023

Secteur 2
En travaux

MINISTÈRE
DES TRANSPORTS


L'État investit
pour la sécurité
Construction
d'un échangeur

CHANTIER
de mars 2026
à décembre 2027


Information
www.dira.fr

Coût de l'opération
14,6 millions d'euros

Secteur 3
Études en
cours

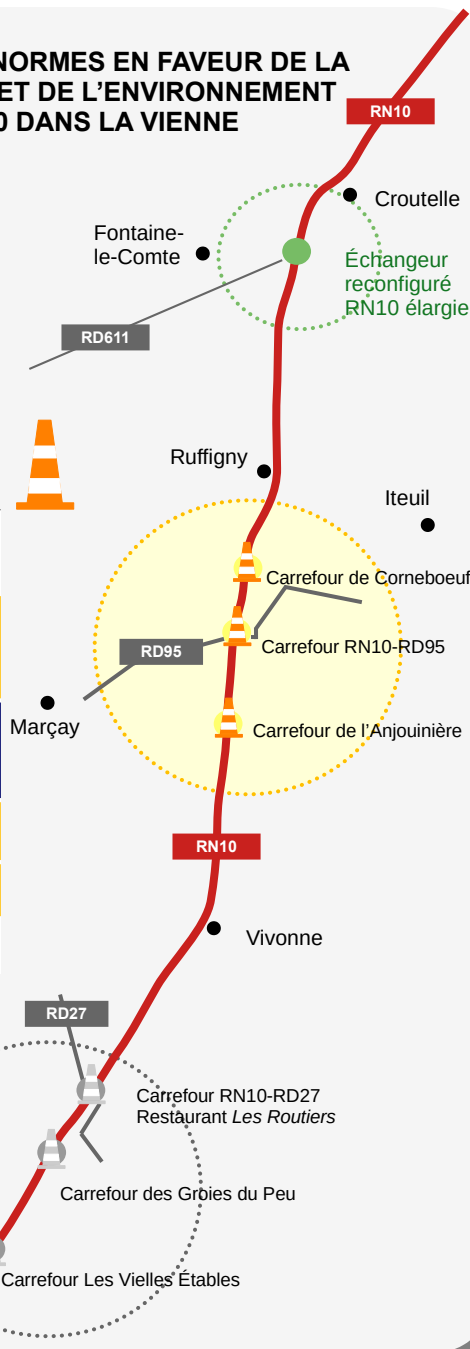


Étape 1 Construction de l'échangeur

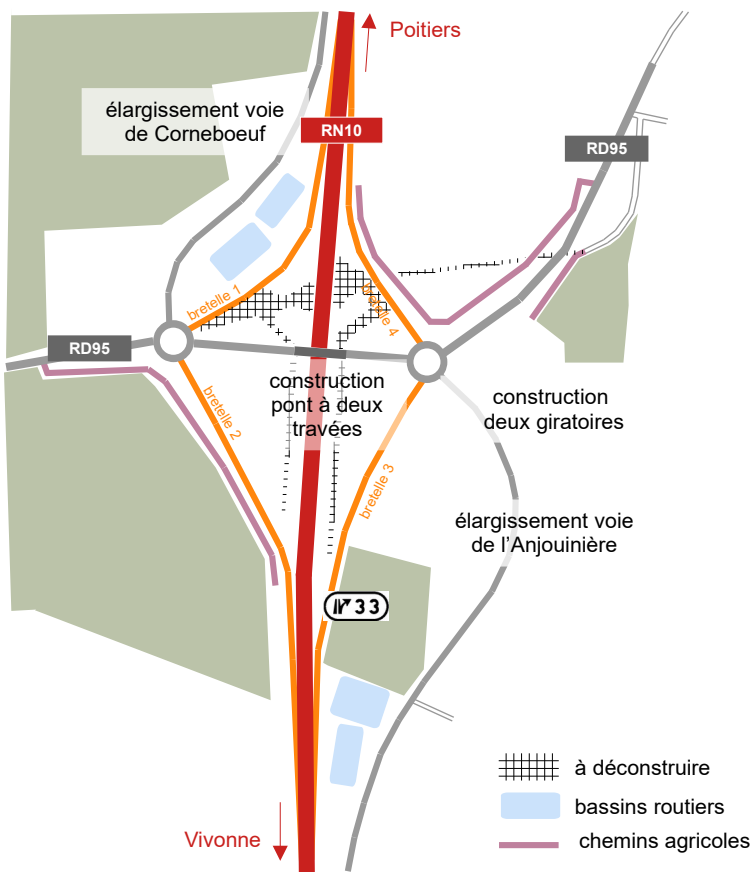

PHASE A

de mi-mars 2026
à début juillet 2026

Étape 2 Aménagement
de la bretelle de l'Anjouinière

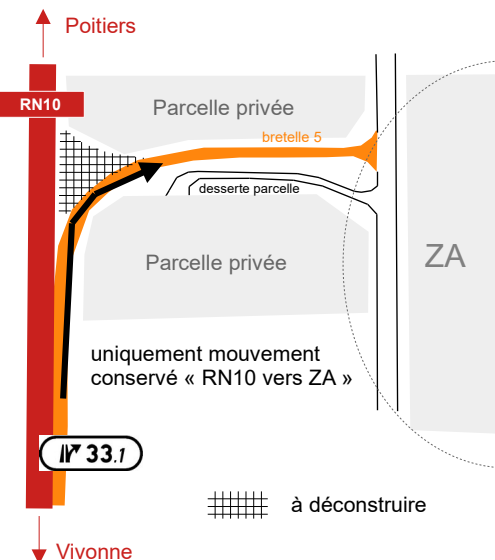

Mars 2026

Étape 1

Printemps 2027

Étape 2

Phase A

Pile et culées du pont
Terrassements
Assainissement
(dont bassin)

Phase B

Fin culée est
et tablier est
Amorces
bretelles et
chaussées

Phase C

Fin culée ouest
et tablier ouest
Amorces
bretelles et
chaussées

Phase D
(1 journée)

Bétonnage du
tablier du pont

Phase E

Corniches du
pont
Travaux en terre-
plein central
Chaussées

Phase F

Travaux en
accotement
Finitions


Travaux sur
bretelle de
l'Anjouinière




La DIRA remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée et leur recommande la prudence pour leur propre sécurité et celles des travailleurs intervenant sur le chantier.

16 mars 2026


Fermetures

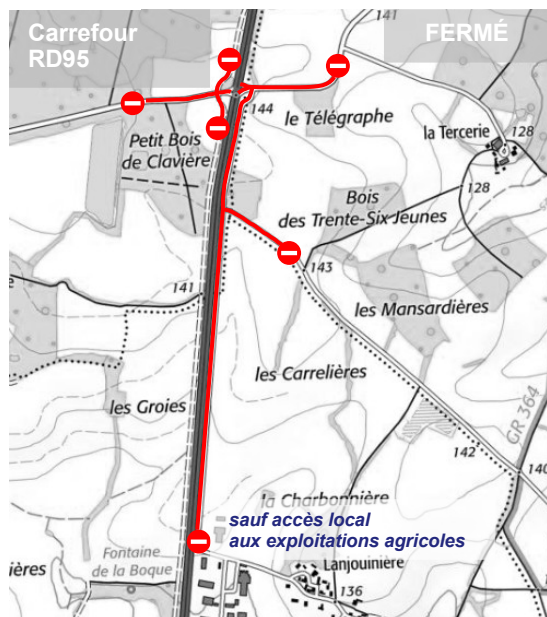


Section courante RN10

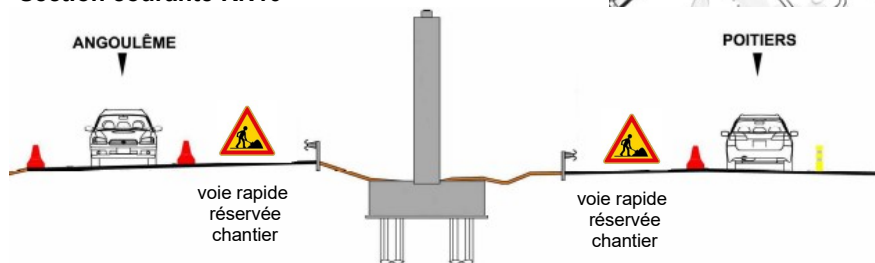

Déviations

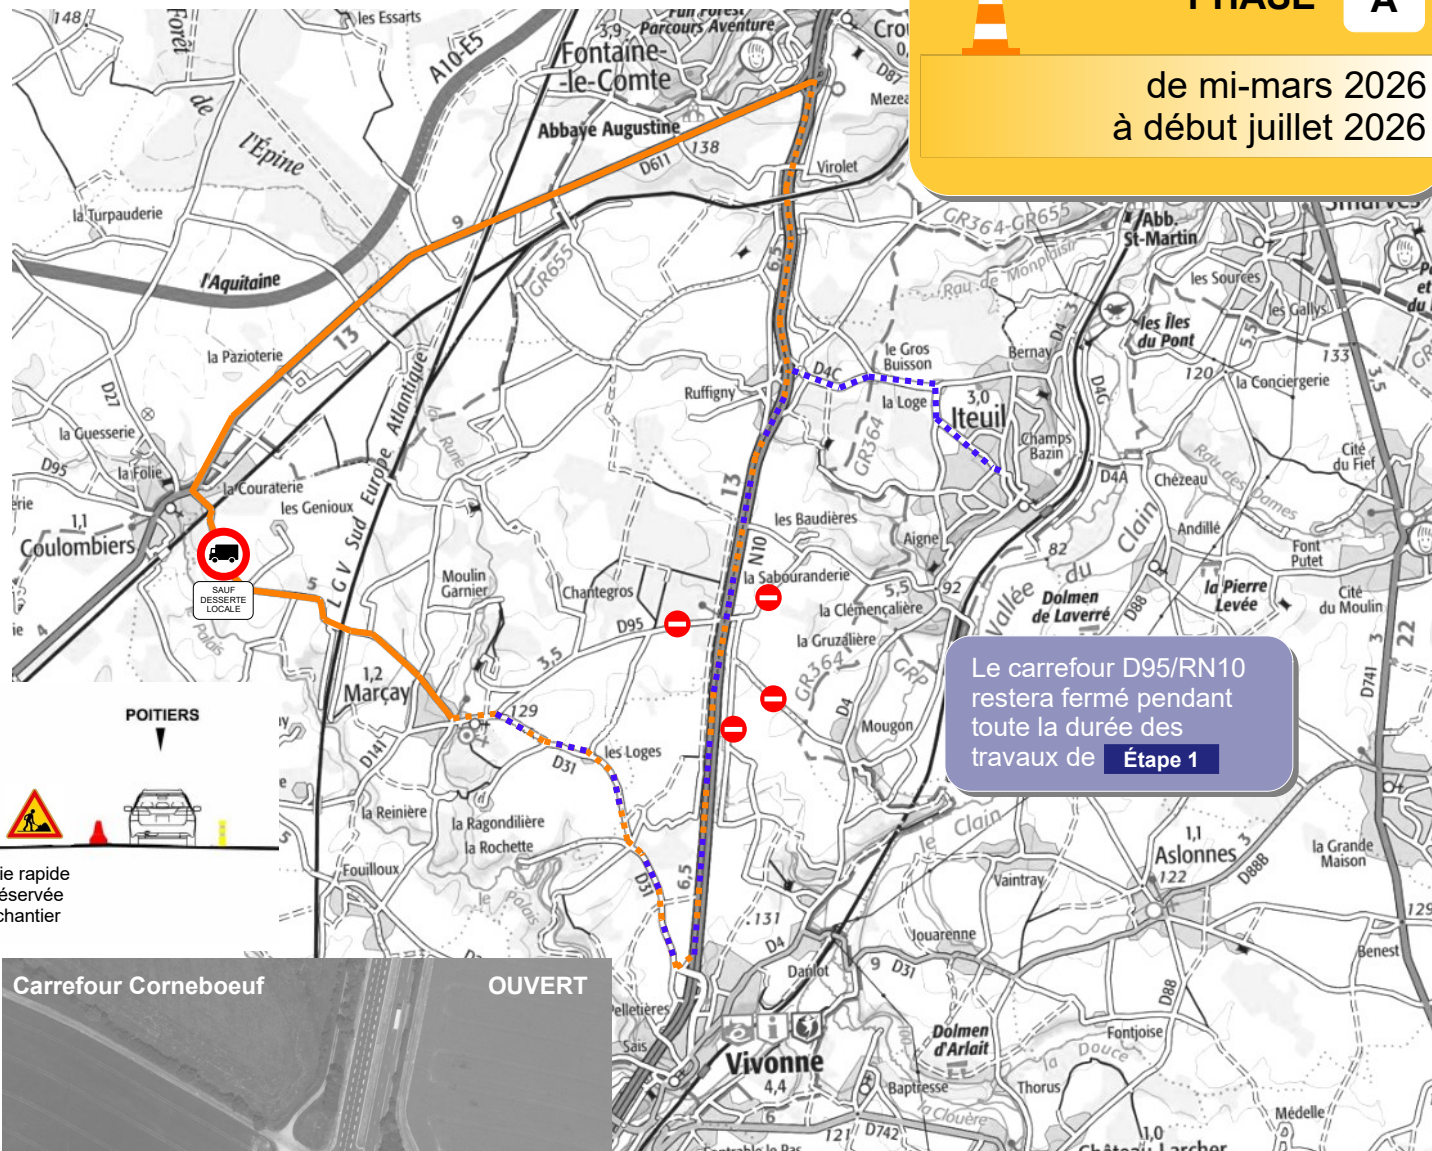

Le carrefour D95/RN10 restera fermé pendant toute la durée des travaux de **Étape 1**

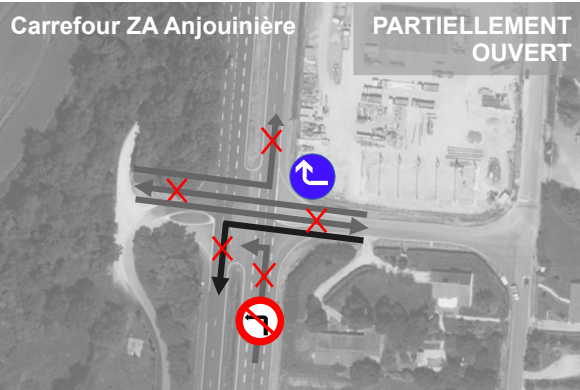

Déviations Poitiers – Marçay

- VL
- PL obligatoire

Déviations Iteuil – Vienne – Marçay

- PL obligatoire
